

颍泉铁路建设 工作简报

(2024 年第 35 期 总 40 期)

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024 年 11 月 25 日

淮宿阜城际铁路是《中原城市群发展规划》确定的重点项目，属于省、市重点工程。安徽（阜阳）铁路国际物流港项目作为阜阳市颍泉区重大的交通基础设施项目，颍泉区政府高度重视，成立工作专班，专人负责调度，近期有关工作进展简报如下：

一、淮宿阜城际铁路项目

建设情况：阜淮高铁沿线正按照年度计划有序进行建设。路基站场土方累计完成 26.7 万方，占设计比例 96%；桥梁钻孔桩累计完成 7678 根，占设计比例 99%；预制梁累计完成 490 孔，占设计比例 49%；架设梁累计完成 372 孔，占设计比例 37%。本年度预计投资 10.5 亿元，截至 8 月底已完成 **9.73** 亿元。（此数据来源阜淮公司 9 月底统计更新）

目前，阜淮铁路桥梁工程下部结构除涉铁影响外已基本完成；正开展预制梁、架梁、桥面系、路基防护、站后“四电”等工程施工。下一步，阜淮铁路项目将开始无砟轨道施工。预计 2025 年 3 月，跨颍河斜拉桥将迎来合龙；同年 4 月开始进行站房施工；2025 年 9 月开始铺轨。

整个项目计划 2026 年全线建成通车。


11 月 24 日，阜淮铁路泉河特大桥跨泉河连续梁顺利合龙，标志着阜淮铁路建设再次按下“快进键”，为早日实现通车奠定坚实基础

工作推进：

区铁办协调对接四电工程加紧实施，牵引所、站所施工进场。

区铁办督促各镇办完善后续验工计价资料，加快清概、概算工作，确保后续资金按时拨付。

区铁办协调及时解决处理阜淮高铁施工过程中所遇问题，全力保障施工环境。

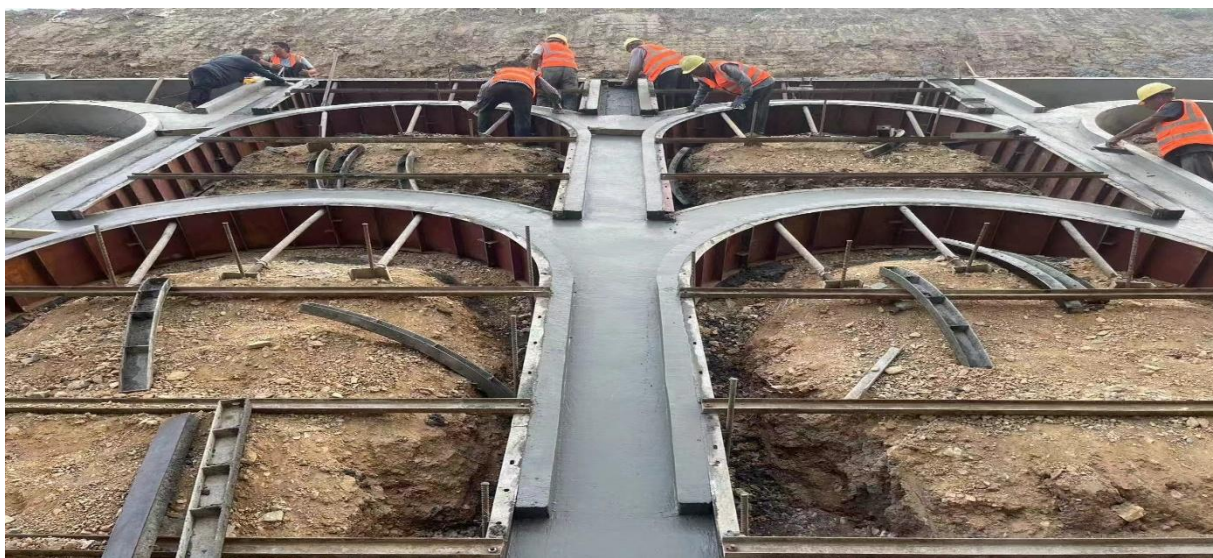

图：阜淮高铁（一分部）路基边坡防护施工现场

二、安徽（阜阳）铁路国际物流港项目

铁路部分：牵出线轨道调整，机车轧道；钢结构檩条安装；叉车库外墙油漆施工，铺地板砖，室内暖通消防安装，电力安装；场地地面级配碎石完成 800 立方，累计完成 5283 立方。水稳完成 1000 立方，累计完成 6604 立方。混凝土硬化完成 3500 平方米，累计完成 19100 平方米。；站台面级配碎石完成 250 立方，累计完成 1200 立方，砂垫层 500 立方，累计完成 500 立方。

本周工程投资完成量为 450 万元，工程累计投资完成量为 21121 万元。
铁路一期（414 亩）建设接近尾声。



图：物流港铁路作业区轨道调整现场

进出港大道部分：

陆港大道：

(1) K0+000-K1+200 段树穴石安装完成，K1+500-K2+000 段右幅人行道道板砖铺设完成；(2) K1+300-K1+500 段左幅人行道外缘石安装完成、混凝土浇筑完成；K2+340-K2+580 段中央分隔带侧平石安装完成；(3) K2+580-K3+114 段收水井连接管开挖、安装、砼包封完成；交通工程、弱电工程、照明工程、给水工程过路管安装、混凝土包封完成；(4) K2+000-K2+580 段交通工程管道安装、井室砌筑完成；K2+000-K2+360 段弱电工程、给水工程井室砌筑、井周回填完成；K2+000-K2+300 段路灯管道安装完成。

利辛路

K0+215-K0+365 处沟塘第 19 层 6%灰土回填完成。

存在问题：

1. 道路沿线社区居民申请要求增设进出口，区铁办已会同社区、设计人员现场查看，初步确定预留出行路口位置，由设计进行整理后向建设单位汇报研究确认后实施。

2. 019 交口铁路限高架处在主路上，已经现场协商迁移事宜。

3. 第二路电源电力施工，9 基钢管塔基已施工完成，下一步进行立杆架设，由于与新路集团铺设沥青交叉作业，影响施工进度，正在协商解决。



图：进出港大道 K2+580-K3+114 段收水井连接管安装现场

地方仓储部分：

土地报批已于 11 月 5 日获得批复，首批国债项目 162 亩地块正在进行统计摸底征迁中，确保国债项目 12 月进场开工建设。

水电接入铁路工程情况：

1. 电力接入情况：第二路电源塔基已完成，正在立杆架设，力争 12 月 5 日完成。

2. 陆港大道及铁路污水管网：中铁二十四局施工方案已完成，11 月 14

日武汉建设指挥部指挥长金胜利来阜阳调研阜西联络线平改立工作，向阳路道口与利辛路综合管廊施工作业点一并汇报审查，力争获得武汉建设指挥部支持。

工作推进：

11月18日，市政府主持召开2024年阜城新型城镇化项目建设第39次周调度会，会议详细理了项目进展情况和存在问题，并对下一步工作进行了指导。

11月21日，区委书记刘万和深入项目现场进行调研。详细了解项目建设进度情况。

11月22日，颍泉区召开重点项目要素保障会暨安徽（阜阳）铁路国际物流港专题调度会，针对目前物流港内突出的十四项问题清单，了解工作最新进度，指导下一步工作，具体事项责任到人，全力保障物流港项目稳步推进。

报：区委书记刘万和，区委副书记、区长时新，区委常委、常务副区长李祎楠，副区长韩贵武，区直有关部门

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024年11月25日
